

Contrat Biodiversité



Fiche de réalisation de chantier

Mongerex : Revitalisation d'un talus séchard ; Déboisement de la butte et mise en tas.

Informations Générales

Date des travaux : du 21 novembre au 30 novembre

Durée des travaux : 6 jours ouvrables

Moyens humains et techniques mis en œuvre :

Entreprise forestière Raymond Dubugnon : 1 chef d'équipe ; 3 machinistes

Engins : 1 tracteur avec grue, scie mécanique, 1 Gyrobroyeur.

Entreprise Spycher : Broyage de bois


Services forestiers : 1 Garde forestier (représentant maître œuvre) ; 1 forestier bûcheron

Déroulement du chantier :

1. Marquage des arbres à abattre et des essences à conserver ; marquage des arbres à anneler.
2. Coupe et débroussaillage de 50% de la surface.
3. Abatage des fûts marqués et annelage
4. Confection des tas de bois-mort : 5-6 de 1 à 3m³ en lisière exposés sud.
5. Broyage et évacuation de la coupe.

Cartographie des mesures

Mesures et cartographie du site

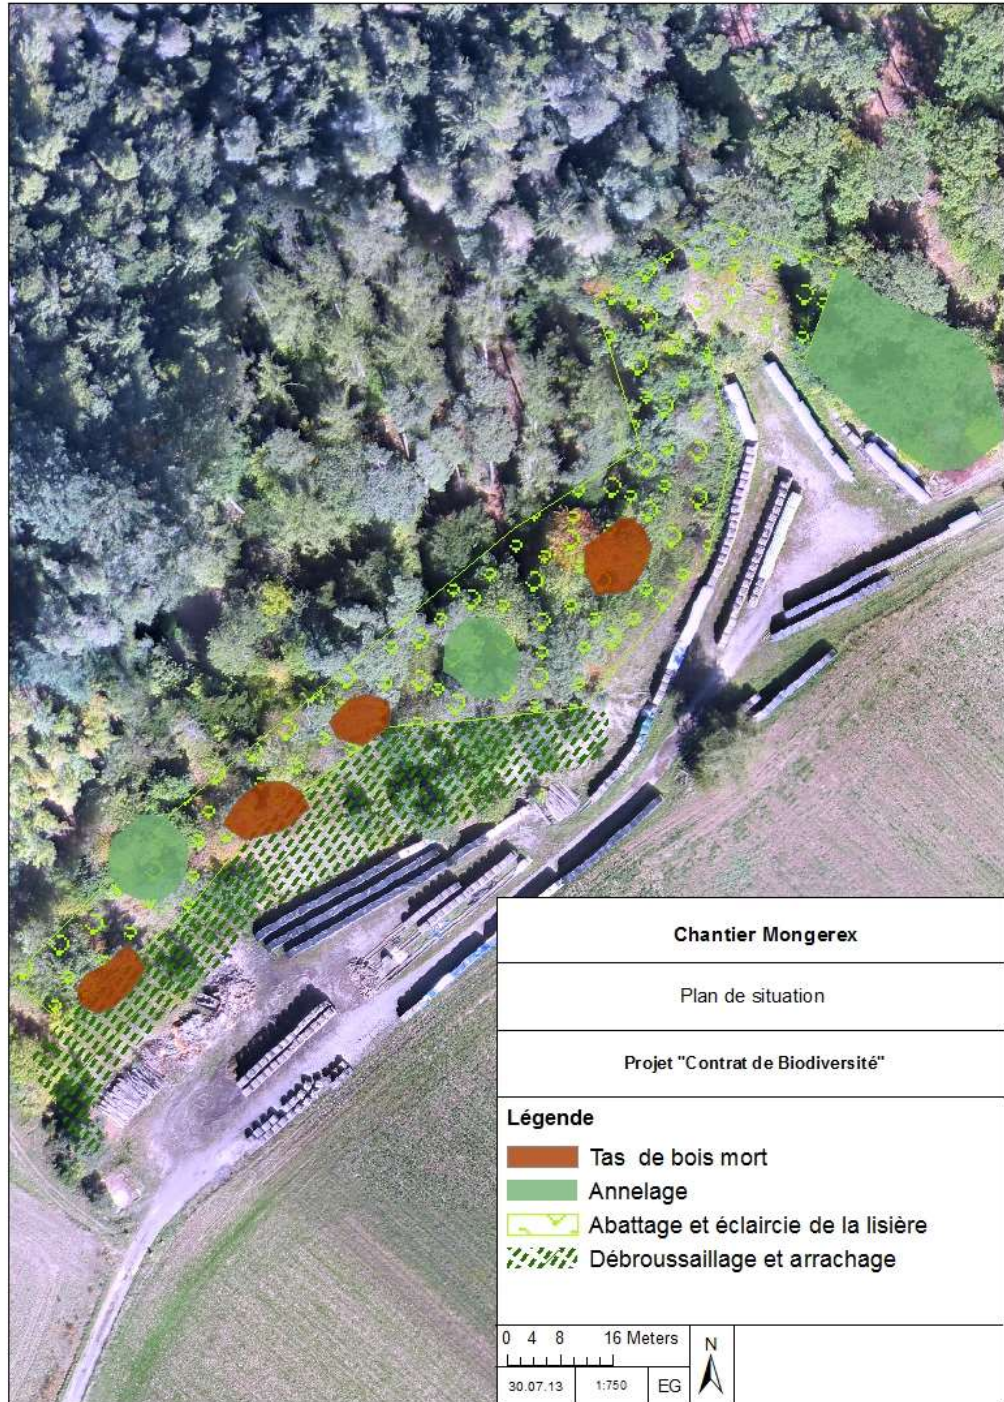

Aperçu du chantier

Pendant les travaux



Après travaux



Aperçu du chantier

Après travaux

