

## Contrat Biodiversité



## Fiche de réalisation de chantier

Fiche  
n°1

14.10.13

## Bois-Lourd : défrichage et réouverture d'un milieu humide ; installation d'un étang forestier temporaire

### Informations Générales

**Date des travaux** : du 03.09.2012 au 13.09.2012

**Durée des travaux** : 9 jours ouvrables

**Moyens humains et techniques mis en œuvre :**

**Entreprise forestière Pasche** : 1 chef d'équipe ; 1  
machiniste


**Engins** : 1 tracteur avec benne de transport ; 1 pelle 5t.

**Services forestiers** : 1 Garde forestier (représentant  
maître œuvre) ; 1 forestier bûcheron

**Déroulement du chantier :**

1. Marquage des arbres à abattre et des essences à conserver ; marquage des arbres à anneler.
2. Coupe du sous-étage et débroussaillage
3. Abatage des fûts marqués et annelage
4. Confection des tas de bois-mort (5 tas env. 15 m<sup>3</sup>)
5. Terrassement ; creuse de la zone humide et diversification du fonds et des berges
6. Stockage définitif du déblais (env. 100 m<sup>3</sup>) et talutage sur zone périphérique

**Mesures et cartographie du site**

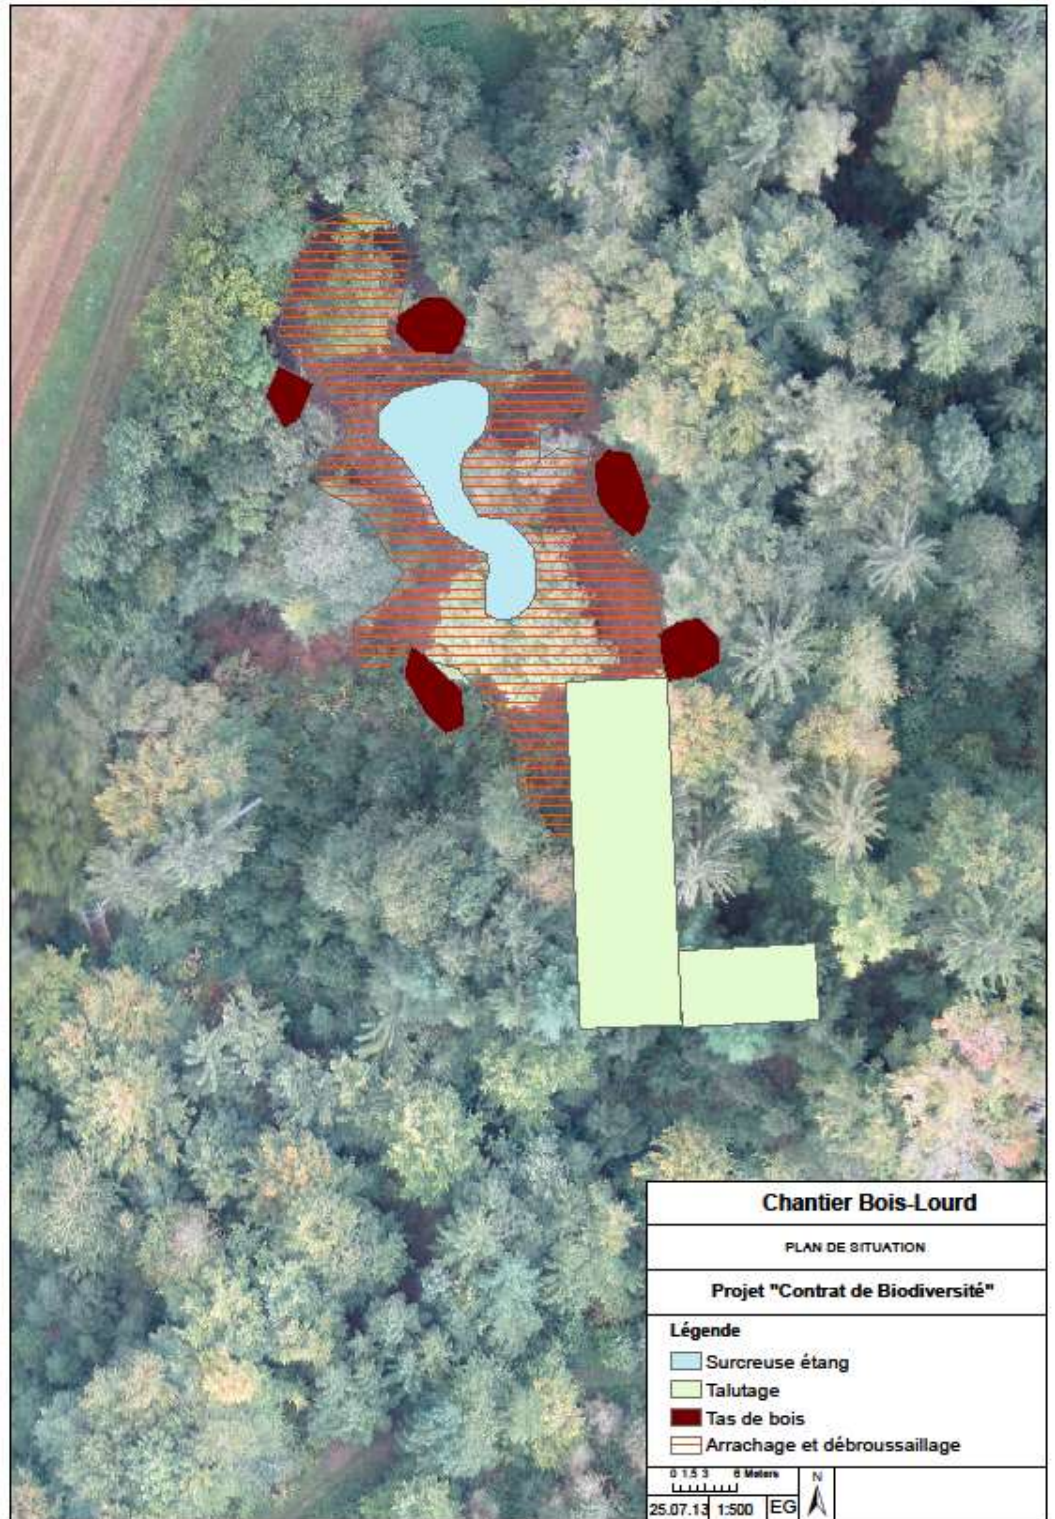

Aperçu du chantier

Avant travaux



Pendant les travaux



Après travaux



Aperçu du chantier

Après travaux

